


Skema til screening af konkrete projekter


Sagsnr.: 09.40.00-P19-2-26 Screening for miljøvurderingspligt, renovering af bro over det offentlige vandløb Ringgrøften

Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)	Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
Basis oplysninger		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Udskiftning af rørunderføring nr. 14770 – Engvej, UF af K-vandl.65 Ringgrøften. Det eksisterende bygværk består af et 7,45 m langt, Ø125 cm betonrør med frontmure, ved både ind- og udløb. Jammerbugt Kommune ønsker at udskifte eksisterende betonrør, pga. dets tilstand. Det eksisterende bygværk udskiftes til et Ø140 cm armeret betonrør med en længde på 12 m Røret forlænges i begge ender og frontmure fjernes, så der kan etableres frie skråninger. Betonrøret lægges vandret og der etableres ny vandløbsbund hele vejen igennem røret. Den nye vandløbsbund tilsluttes eksisterende.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Kristian Olsen, 72 57 73 35, kol@jammerbugt.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Esben Elgaard Hansen, 60 36 16 95, eehee@ramboll.dk	

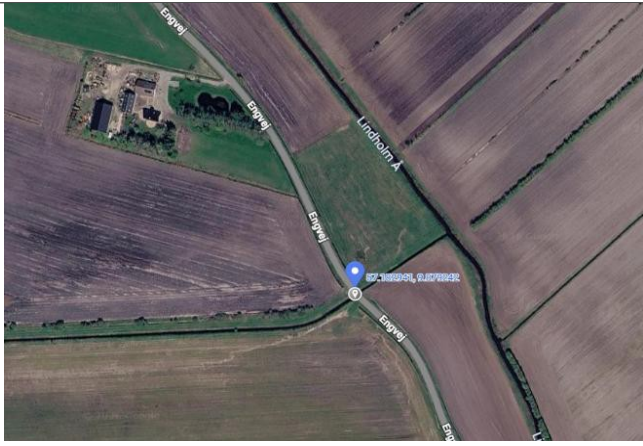

Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)	Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
Projektets adresse, martr.nr. og ejerlav. (For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i brede/længde)	Adresse: Engvej, 9381 Sulsted Litra: 7000f Ejerlavsnavn: Nørhalne By, Biersted Ejerlavskode: 600453	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Jammerbugt Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000. For		

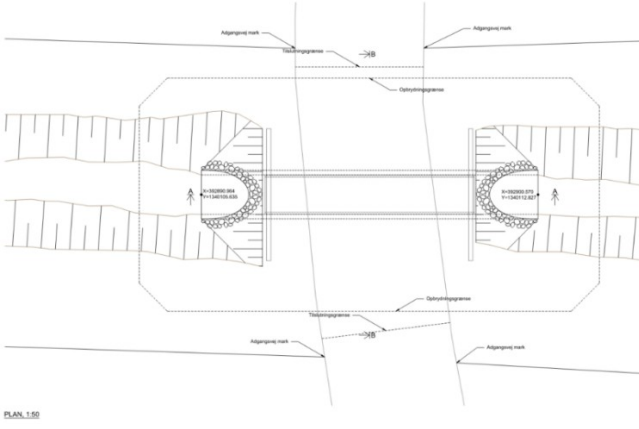

Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)	Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (dog ikke for strækingsanlæg)		

Forholdet til VVM-reglerne				
	J a	Ne j	Bemærkninger (bygherre)	Bemærkninger (kommune)
Er projektet opført på bilag 1 til miljøvurderingsloven		X		
Er projektet opført på bilag 2 til miljøvurderingsloven	X		Punkt 10, f	



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)	Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
---	-----------------------------------	-----------------------------------

Projektets karakteristika		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. Nr. og ejerlav	Bygherre ejer arealer	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m². • Det fremtidige samlede befæstede areal i m². ○ Nye arealer, som befæstes ved projektet i m².	Arealanvendelsen efter projektets realisering er uforandret.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning • Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	I projektets anlægsfase er det ikke nødvendigt med midlertidig grundvandssænkning. Grøften opdæmmes og overpumpes imens arbejderne udføres. Midlertidig tørholdelse af udgravninger udføres med lænsepumpning. Projektets samlede grundareal, hvor der midlertidigt vil blive udgravet, er omkring 135 m². Det befæstede vejareal er omkring 4,5 x 8,5 m, og forbliver uændret i driftsperioden.	



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)	Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
• Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² • Projektets bebyggede areal i m² • Projektets samlede bygningsmasse i m² • Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Frontmure og den gamle rørunderføring skal nedrives.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden • Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: • Vandmængde i anlægsfasen: • Affaldstype og mængder i anlægsperioden: • Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden:	Forbruget af vand vurderes til at være ubetydelig. Projektet vil ikke generere spildevand Projektet vil genere en begrænset mængde affaldt. Jord, støttevægge og den gamle rørunderføring bortskaffes efter Jammerbugts kommunes direktiver. Regnvand vurderes til ikke at have betydning, den mængde regnvand som vil falde i udgravningen, vil blive overpumpet sammen med vandet i grøften. Anlægsperioden vil være én uge i perioden 01/09/26-30/09/26.	



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)	Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
• Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden: • Håndtering af regnvand i anlægsperioden: Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå:		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/projektet i driftsfasen • Råstoffer – type og mængde i driftsfasen • Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen • Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ved udskiftningen til nyt betonrør forøges rørets det frie areal omkring 4%. Denne forøgelse vurderes ubetydelig, så grøftens vandmængde er uforandret.	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af produktet i driftsfasen	Ikke relevant	



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)			Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
- Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand til renseanlæg: - Spildevand med direkte udløb til vand, sø, hav: Håndtering af regnvand:			Vandløbet er ikke påvirket af spildevand fra noget byområde.	
	J a	Ne j		
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?				
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller	X			



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)			Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
krav i branchebekendtgørel- sen?				
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF- dokumenter?				
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X			
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		.		
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner	X			
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X		
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt	X			



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)			Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X			
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening		X		
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X			
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende	X			



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)			Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
grænseværdier for luftforurening?				
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener? • I anlægsperioden • I driftsfasen	X		Ved tørt vejr kan der forekomme lidt støv ifm. udgravningen i anlægsperioden.	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener • I anlægsperioden • I driftsfasen		X		
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne • I anlægsperioden • I driftsfasen		X		
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen (bekendtgørelse om kontrol med risikoen		X		



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)		Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
for større uheld med farlige stoffer)			
Projektets placering			
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X	Åbeskyttelseslinjer. Udskiftningen af røret anses som en 1:1 udskiftning. Generelle forhold i driftsperioden forbliver uændret.	Da der gives tilladelse efter Vandløbslovens, er det ikke nødvendigt med dispensation fra Åbeskyttelseslinjen
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov (skov er bevokset areal mellem træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af		X	



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)		Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere ned 20 meter bredt)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hindring for realisering af en rejst fredningssag	X		
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3		Projektet ligger i et åbeskyttelsesområde og i en afstand på 450 m til beskyttet mose og beskyttet sø.	Fra projektområdet er der omtrent 370 meter til beskyttet mose og 600 meter til beskyttet sø.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		I nærliggende område er følgende rødlistede arter registreret: Butsnuddet frø Hvid næbfrø Spidssnuddet frø Tinksmed Husmår havørn Kongeørn Rødglenne vibe Gul evighedsblomst Projektet vurderes ikke at influere de ovennævnte arter på grund af projektets størrelse og korte anlægsperiode, som er i september, hvilket ligger uden for ynglesæsonen.	Projektområdet er beliggende i et område hvor der kan være forekomst af langøret flagermus, vandflagermus, sydflagermus, spidssnudet frø, odder og markfirben. Jævnfør naturdata på Arter.dk¹ er der fundet følgende rødlistede arter: sangsvane, agerhøne og stær indenfor et undersøgelsesområde af 1 km², hvor projektområdet er afsat som centrum af søgefeltet. Det vurderes at projektet ikke vil være til skade for disse arter, deres levesteder eller yngel- og fødegrundlag, grundet projektets karakter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til		2,8 km til Nørre Halne Egekrat	

¹ Arter.dk



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)			Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)																														
nærmeste fredede område																																		
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura-2000 områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og ramsarområder)			5,5 km til natura 2000 område Store Vildmose	Projektområdet er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er Store Vildmose (Habitatsområde nr.H12). Udpegningsgrundlaget for det beskyttede områder er vist i nedenstående tabel: <table><tr><th colspan="3">Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 12</th></tr><tr><td>Naturtyper:</td><td>Indlandssalteng* (1340)</td><td>Søbred med småurter (3130)</td></tr><tr><td></td><td>Næringsrig sø (3150)</td><td>Brunvandet sø (3160)</td></tr><tr><td></td><td>Vandløb (3260)</td><td>Tør hede (4030)</td></tr><tr><td></td><td>Surt overdrev* (6230)</td><td>Tidvis våd eng (6410)</td></tr><tr><td></td><td>Urtebræmme (6430)</td><td>Højmose* (7110)</td></tr><tr><td></td><td>Nedbrudt højmose (7120)</td><td>Hængesæk (7140)</td></tr><tr><td></td><td>Stilkeke-krat (9190)</td><td>Skovbevokset tørvemose* (91D0)</td></tr><tr><td>Arter:</td><td>Hedepletvinge (1065)</td><td>Havlampret (1095)</td></tr><tr><td></td><td>Odder (1355)</td><td></td></tr></table> Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen. Fra projektområdet til de beskyttede områder er der omtrent 5,5 km. Det er Kommunens vurdering, at projektet ikke vil kunne forringe levevilkårene for de arter og naturtyper, der er på udpegningsområdet, grundet afstanden og projektets karakter.	Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 12			Naturtyper:	Indlandssalteng* (1340)	Søbred med småurter (3130)		Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)		Vandløb (3260)	Tør hede (4030)		Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)		Urtebræmme (6430)	Højmose* (7110)		Nedbrudt højmose (7120)	Hængesæk (7140)		Stilkeke-krat (9190)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Arter:	Hedepletvinge (1065)	Havlampret (1095)		Odder (1355)	
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 12																																		
Naturtyper:	Indlandssalteng* (1340)	Søbred med småurter (3130)																																
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)																																
	Vandløb (3260)	Tør hede (4030)																																
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)																																
	Urtebræmme (6430)	Højmose* (7110)																																
	Nedbrudt højmose (7120)	Hængesæk (7140)																																
	Stilkeke-krat (9190)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)																																
Arter:	Hedepletvinge (1065)	Havlampret (1095)																																
	Odder (1355)																																	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i		X		Der nedlægges et rør i vandløbet med en dimension som ikke vil påvirke eksisterende afstrømning af overfladevand.																														



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)			Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomst er?				Vandløbet, hvor vejbroen renoveres, er ikke målsat i henhold til MiljøGIS for vandområdeplanerne 2021-2027.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		Der er ikke registreret jordforurening i området
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?	X			Udpegningen vurderes ikke at have betydning for projektet.
39. Er projektet placeret i et område, der jf. oversvømmelsesloven er udpeget som et risikoområde for oversvømmelse?		X		
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet		X		



Ansøgningsskema fra bilag 1 (Bek. 2024-12-09 nr. 1608)		Anmeldte oplysninger (ansøger)	Myndighedsvurdering (kommunen)
påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)			
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	X		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		I anlægsperioden vil vandløbet være spærret, hvorfor evt. småfisk ikke kan bevæge sig forbi Engvej. For at sikre fisk imod at blive pumpet over etableres pumpen med et filter, som sikrer at fisk ikke kan komme op i pumpen. Derudover pumpes kun i toppen af vandspejlet for at mindske risikoen for at overpumpe sedimenter eller dele af vandløbsbunden	
Konklusion		Resultatet af screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Det konkluderes, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.	

